JR阪和線東岸和田駅付近
高架化事業だより

2期工事施工中！

Vol.45（平成28年11月発行）
大阪府・岸和田市・JR西日本

いま現場では…

駅舎の工事では、上り線のホーム上家の築造を行なっています。

計画上り線（天王寺方面行き）の土木工事も平成 28 年 9 月末を持ちまして概ね完了しました。これから駅部工区では、新駅舎の建築工事、電気工事、信号工事等を行なっていきます。

駅舎建築工事の様子

上り線ホーム高架下から和歌山側を望む

ホーム築造のため、高架下からコンクリートの打設を行なっています。

高架下の様子

上り線ホーム高架下から天王寺側を望む

高架下では、これから本格的な駅舎の工事にとりかかっていきます。

駅部工区

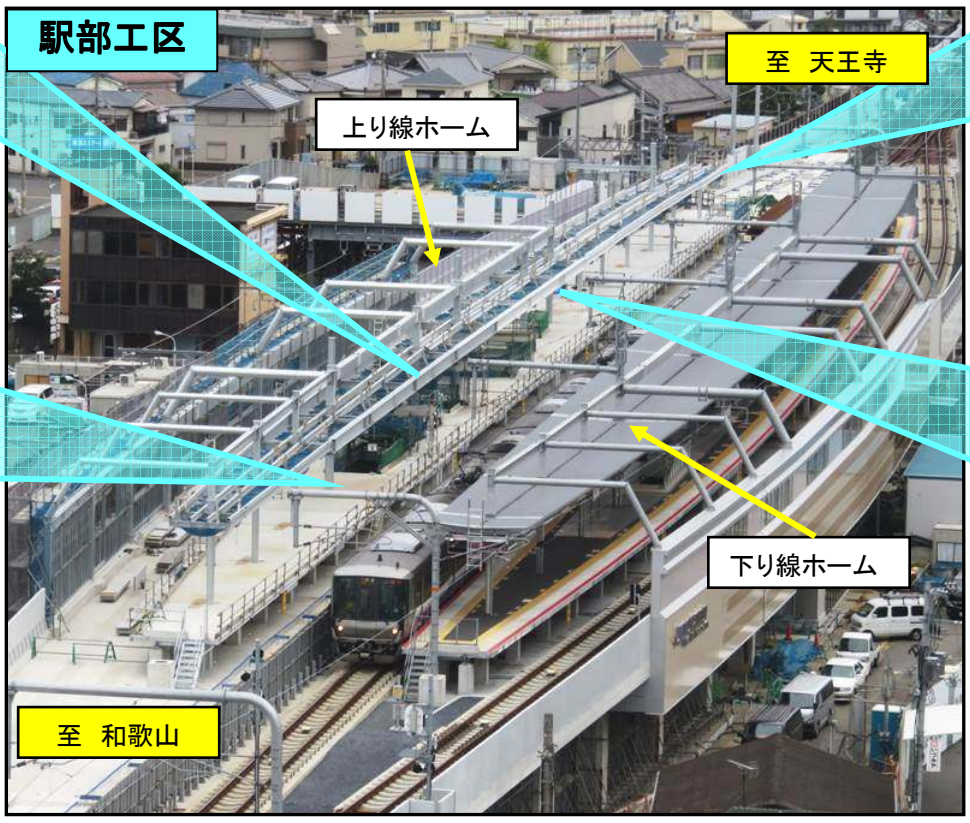

ホーム工事の様子

和歌山側を望む

ホームの柱施工を行なっています。

ホーム工事の様子

下り線ホームから海側を望む

ホームの上家施工を行なっています。

軌道工事の様子

高架橋上では、レールの敷設や枕木の設置が着々と進められています。

北一踏切（地上から高架橋を望む）

北一踏切（高架橋上から和歌山側を望む）

変電所付近（地上から高架橋を望む）

変電所付近（高架橋上から天王寺側を望む）

道路上から見える風景では、高架工事の進捗はわかりにくい状況ですが、高架橋上では、上り線開業に向けて軌道工事を行っています。

施工業者連絡先

【軌道工事】
大鉄工業（株）
東岸和田高架軌道作業所
TEL　072-422-8234

【電気工事】
西日本電気システム（株）
電力支店　電車線工事所
TEL　06-6318-2233

【駅部工区】
清水建設（株）
JR 東岸和田高架作業所
TEL　072-430-6403

今後の工事の予定

・軌道新設工事
・駅舎建築工事
・駅舎電気工事
・信号ケーブル敷設
・信号機器据付

※一週間の詳細な作業内容については、順次作業掲示板にてお知らせします。

高架化事業だよりの問合せ先

◆大阪府岸和田土木事務所　建設課　道路整備グループ
〒596-0076　岸和田市野田町3-13-2
（大阪府泉南府民センタービル内）　TEL　072-439-3601

◆岸和田市建設部　高架事業・道路整備課　高架・街路担当
〒596-8510　岸和田市岸城町 7-1
（岸和田市役所第2別館3階）　TEL　072-423-9544

◆JR西日本　大阪工事事務所　天王寺工事所
〒543-0054　大阪市天王寺区南河堀町6-33　TEL　06-6772-3521

高架化事業だよりは上記の QR コードからアクセスして閲覧することができます。

【軌道検測とは】
列車の安全運行のため、線路の状況を的確に把握し分析する必要があります。
定期的に列車の運行が終わった深夜に総合検測車という車両を線路上で走行させ、レールの歪み、レールの間隔、左右のレールの高低を調査します。
この作業を軌道検測といいます。測定された調査結果をとりまとめて、線路の保守計画を立て、その後、順次保守作業が実施されます。

総合検測車

高架化事業 豆知識

高架化事業のホームページはこちら　→　http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/131/　もしくは　東岸和田　高架　検索　で検索してください。
